

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 31/08/2022

Inspecteur: Andy Van Der Steen

Mentor: -

Installateur: VDC Worxx

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 0881 409 405

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19120239

Datum verslag: 31/08/2022

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Bergveld
Huisnummer	8
Busnummer	
Postcode	2260
Gemeente	Zoerle-Parwijs
Land	België

Eigenaar

Naam	Stepcom BV
Straatnaam	Bergveld
Huisnummer	8
Busnummer	
Postcode	2260
Gemeente	Zoerle-Parwijs
Land	België

Installateur

Naam	VDC Worxx
BTW nr.	BE 0762 496 115
Telefoonnummer	0477230413
E-mail	vdcworxx@telenet.be

Type : woning

EAN :

 Niet meegedeeld

Teller Nr.: -

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 20

Ri algemeen: 343 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 20,0 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	20	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	32		4	6
13	C	20		2	2,5
4	C	16		2	2,5
2	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	in afwachting	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

nota/note 17 De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 31/8/2047
 - De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 - Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Andy Van Der Steen

Andy Van Der Steen

ACEG VZW - #181

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 31/8/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

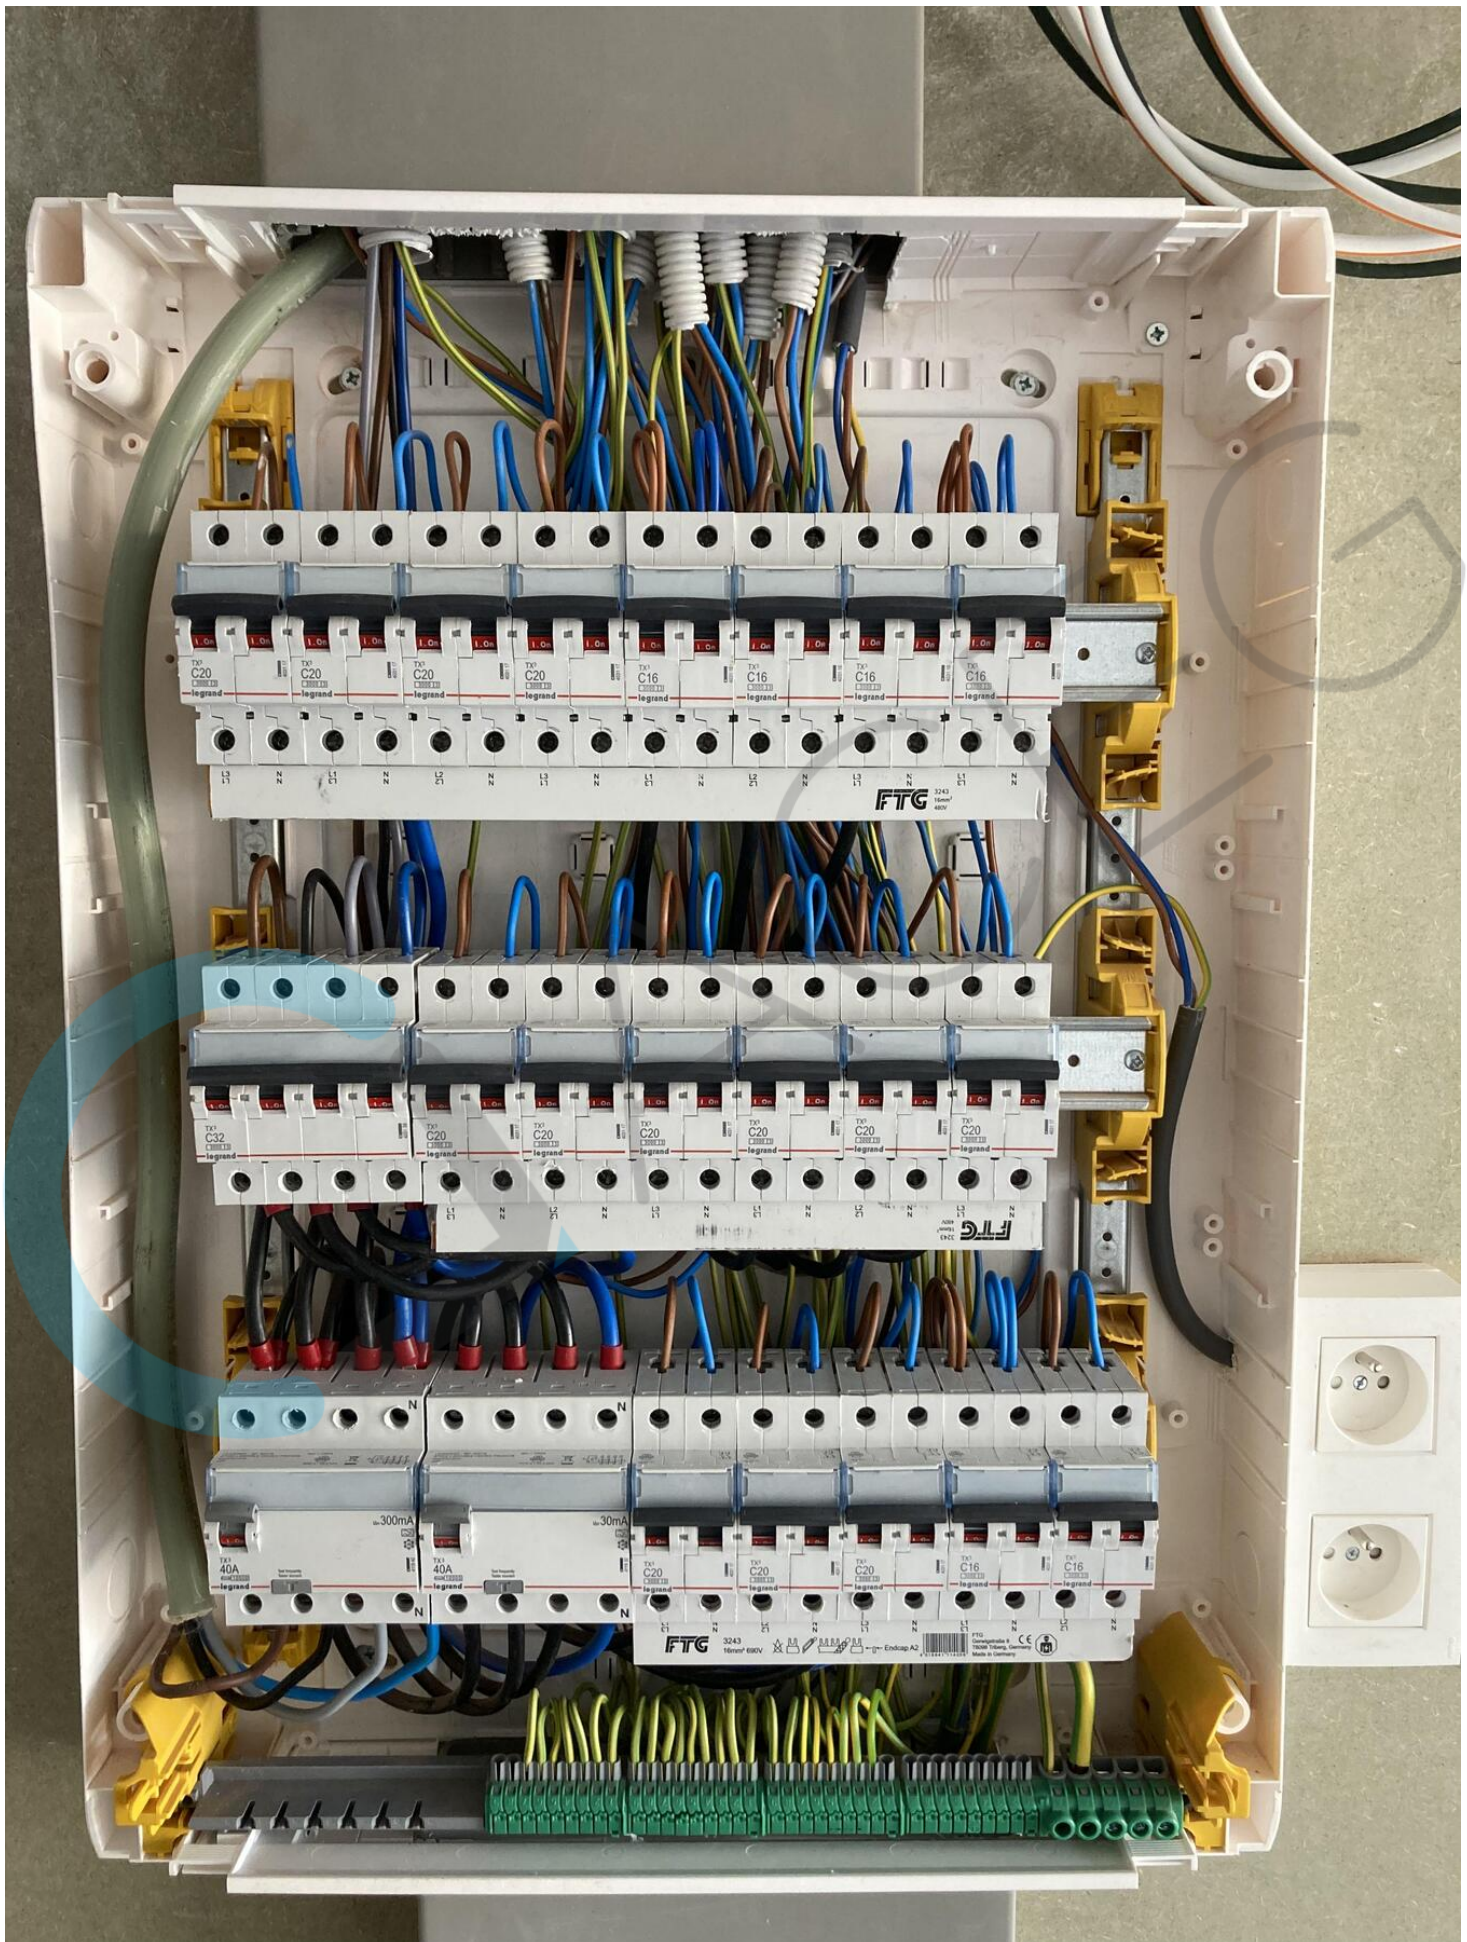




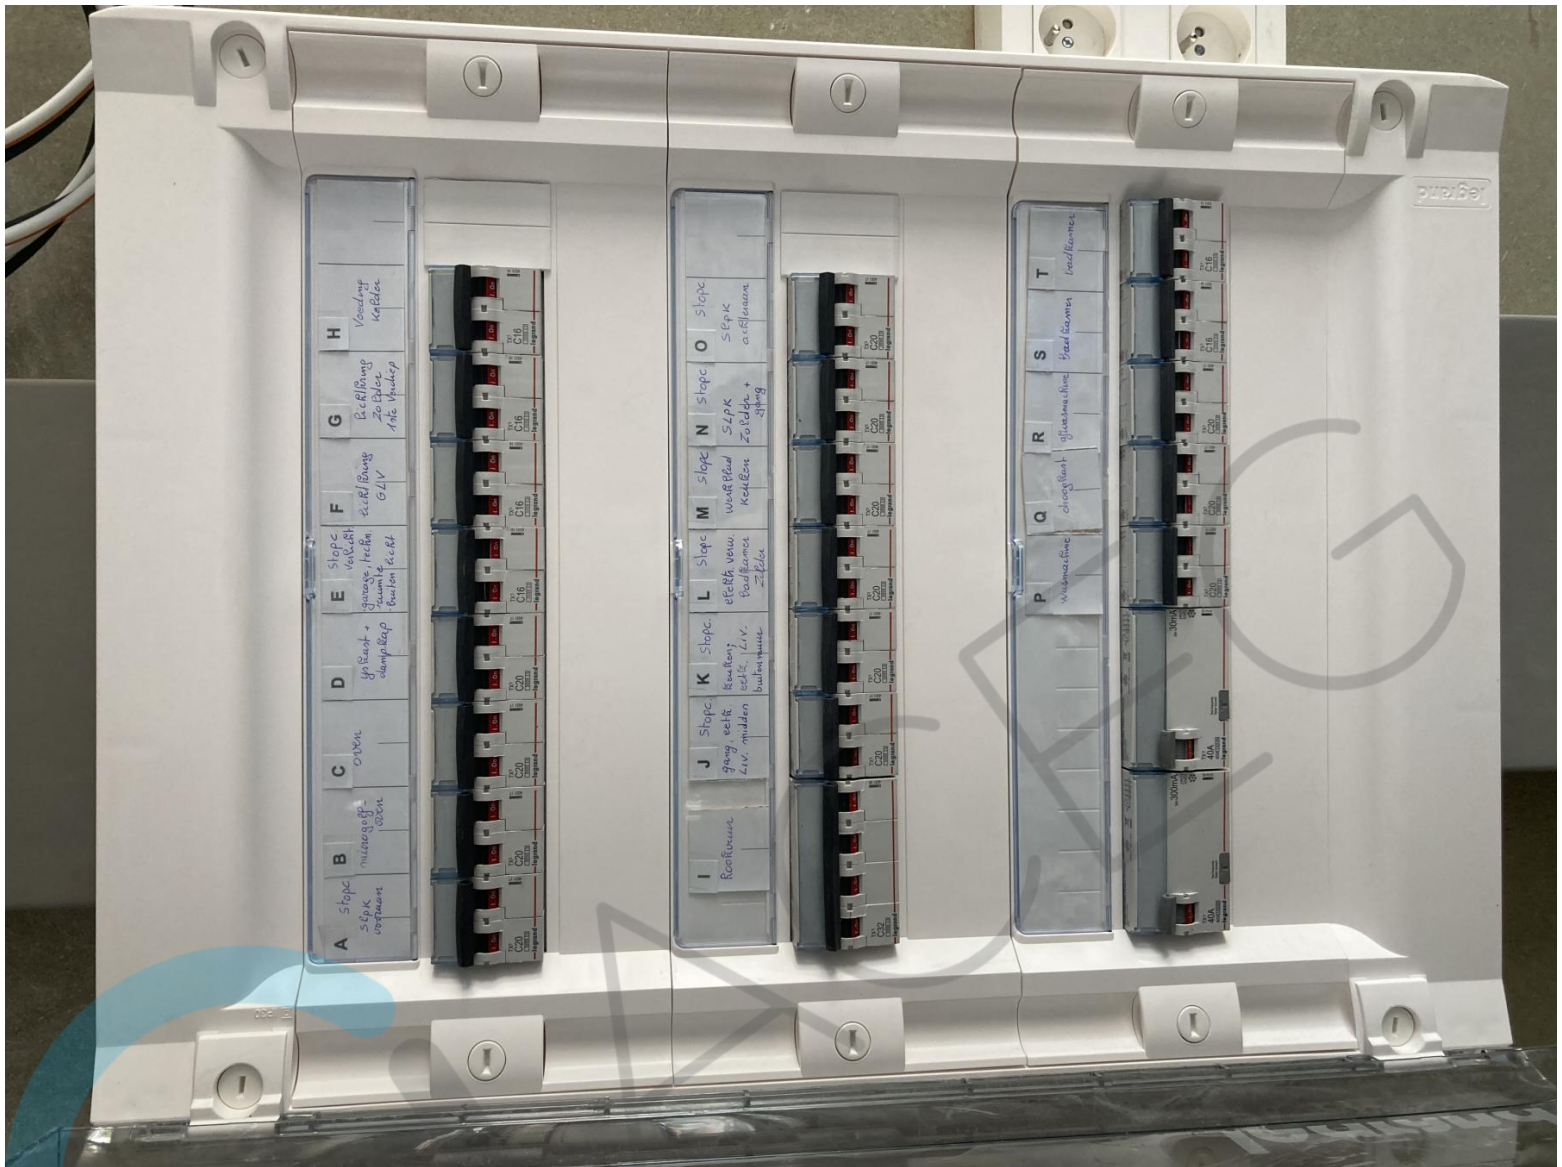





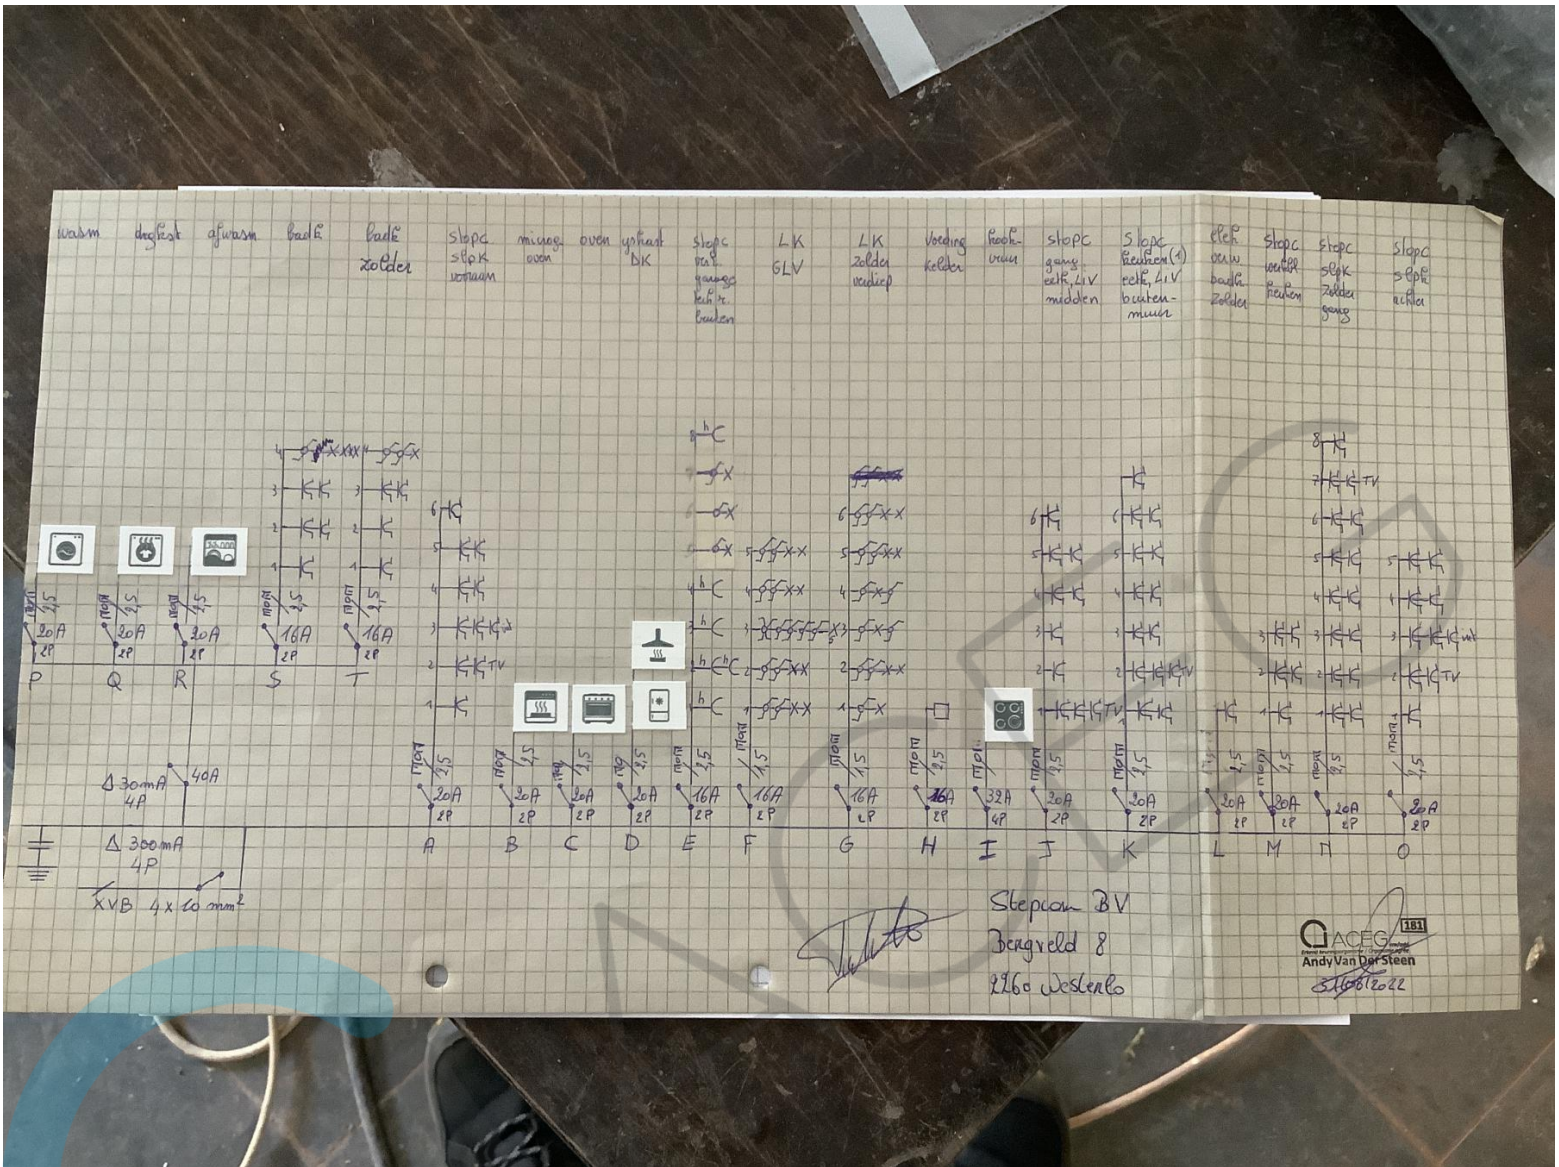


Stapcom BV
 Bergveld 8
 1160 Westerlo


[Handwritten signature]

- A stopc. s.p.k. vooraan
- B microgolfoven
- C oven
- D yskast + dampkap
- E stopc + verlichting garage, rein. ruimte + buiten
- F verlichting GLV
- G verlichting zolder + 1ste verdiep
- H verdeling kabela's
- I badkamer
- J stopc gang, eefl, luring muisden
- K stopc keuken, buiten muur eefl + luring
- L stopc eefl van badkamer zolder
- M werkblad keuken
- N stopc s.p.k. zolder + gang
- O stopc s.p.k. achteraan
- P wasmachine
- Q droogkast
- R afzuigmachine
- S badkamer
- T badkamer

IBBI
 AXES
 Andy Van Der Steen
[Handwritten signature]

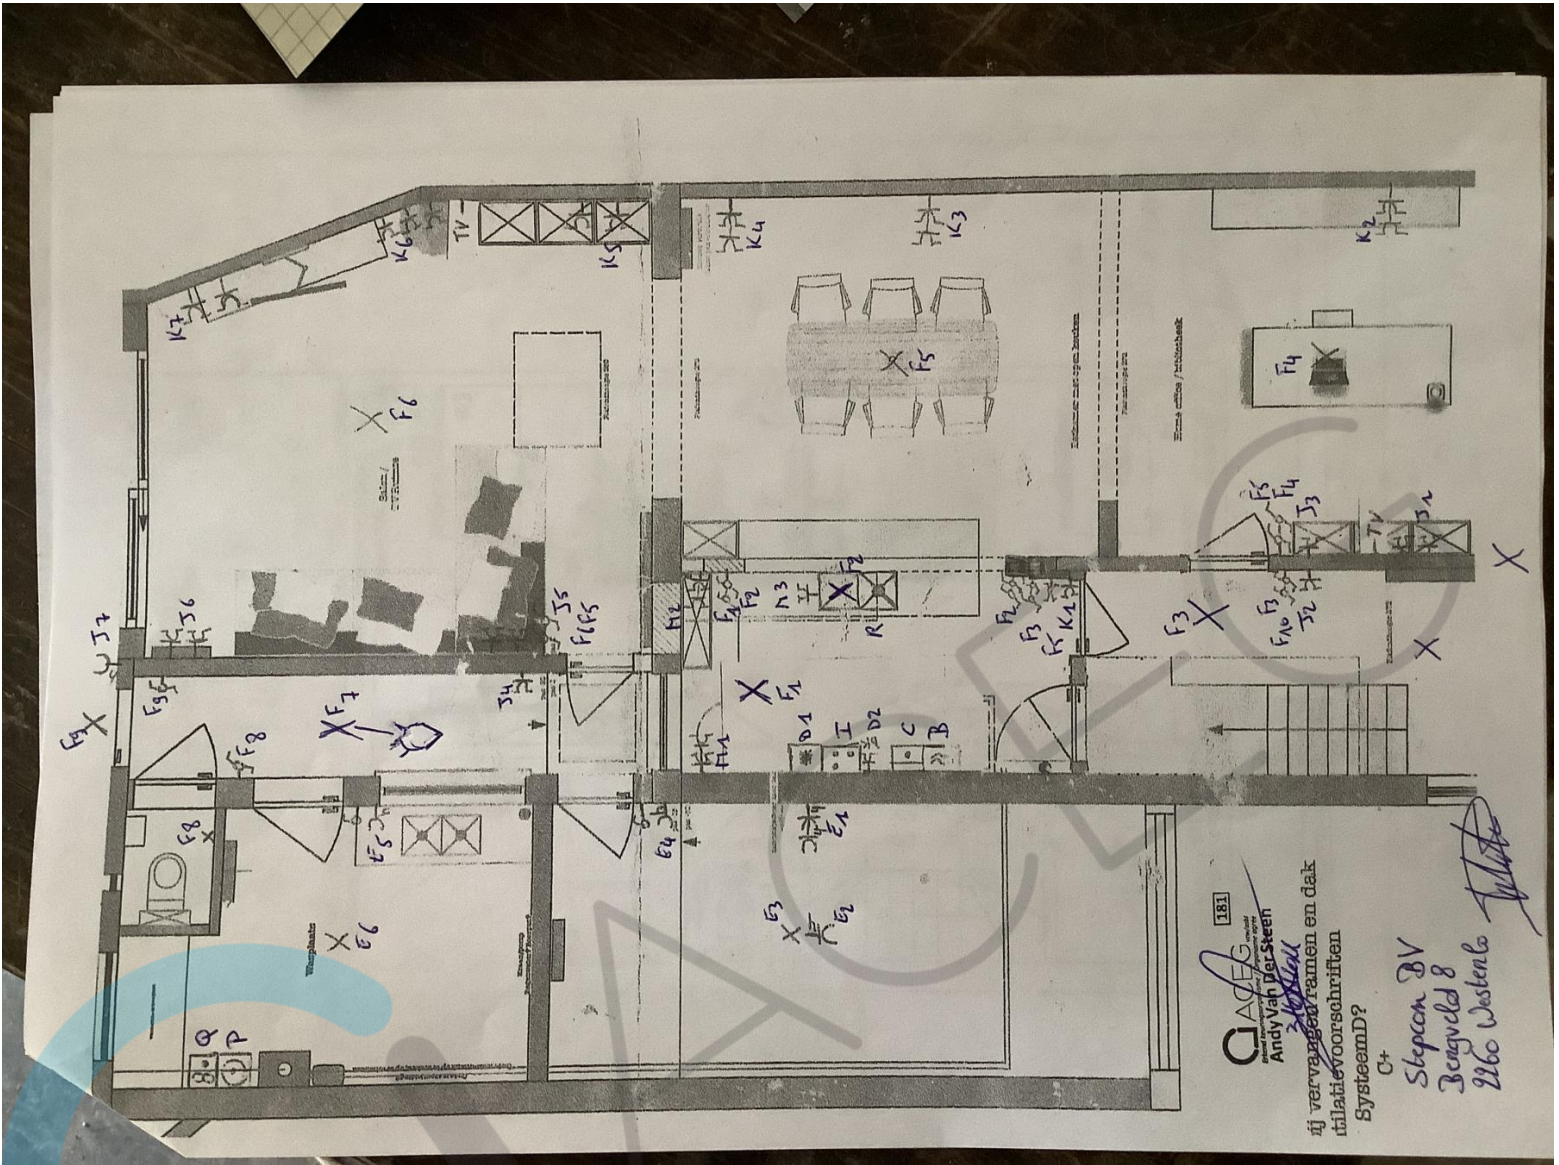


GIA 181
 Andy Van der Steen
 Hout
 Zij vervangt ramen en dak
 dilatievoorschriften
 SysteemD?
 C+
 Stepan BV
 Bengveld 8
 2266 Westenk
[Handwritten signature]

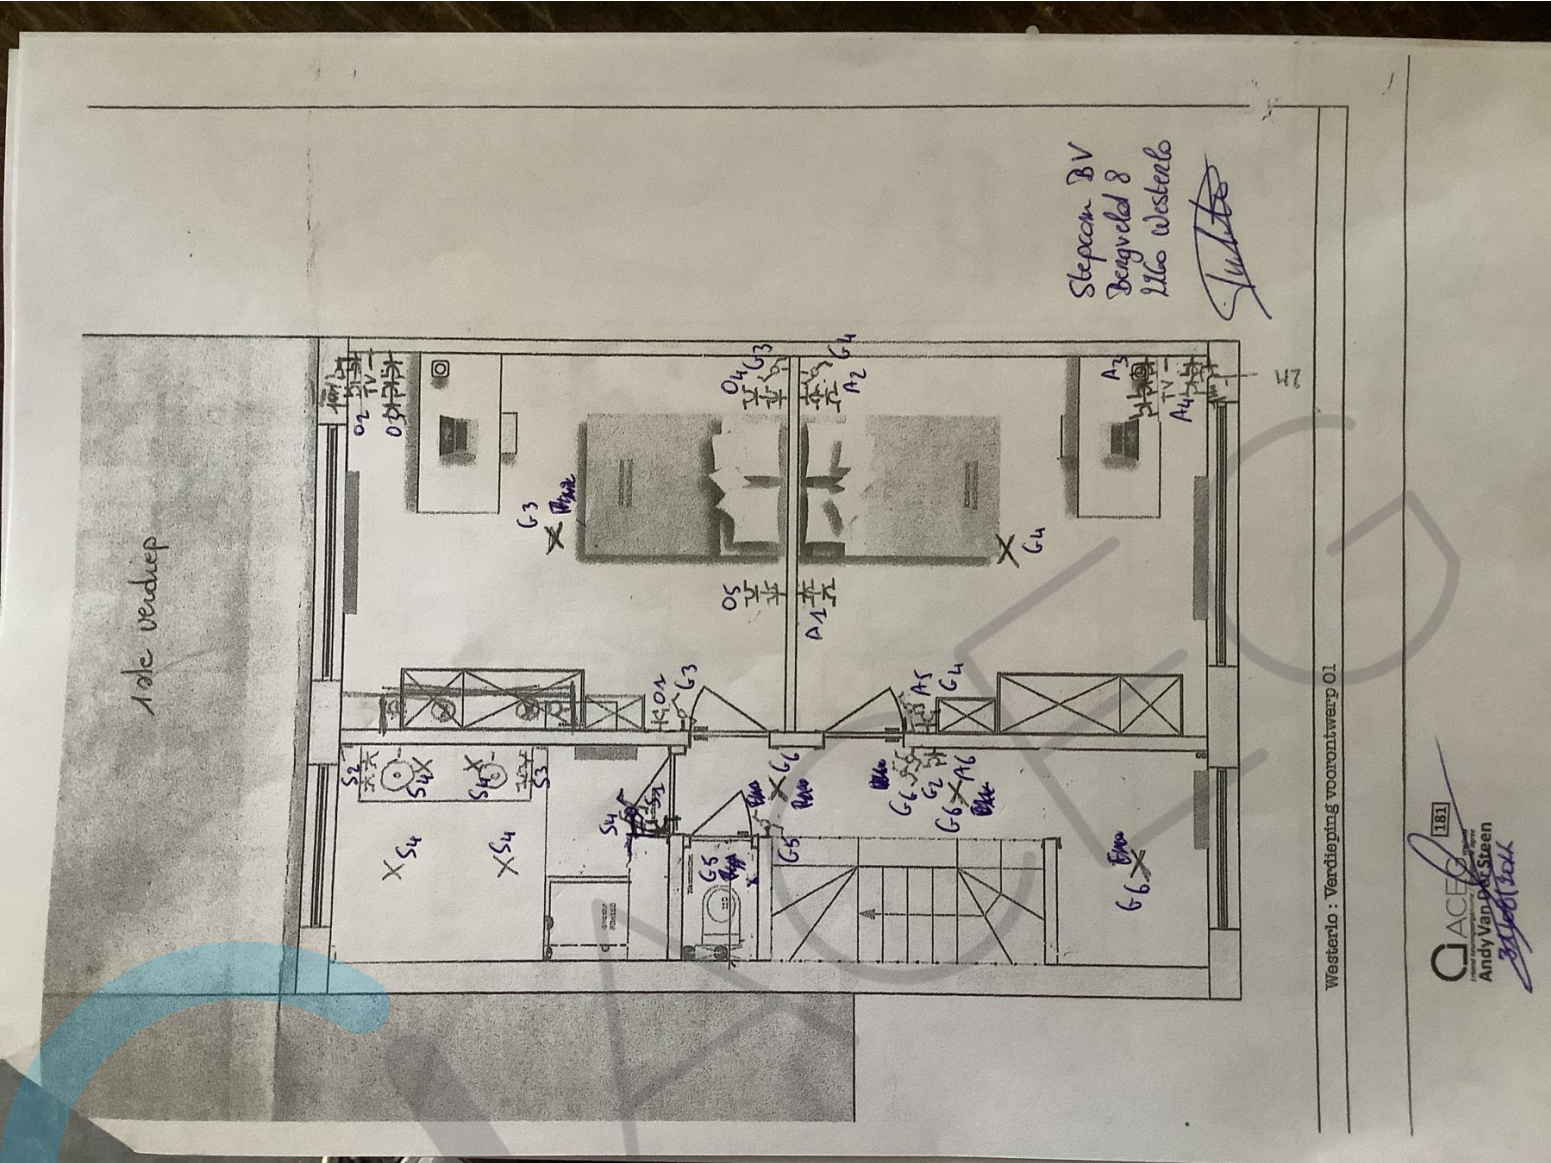

Stephan BV
 Deegveld 8
 2160 Westerbeek
[Signature]

Westerbeek : Verdieping voorontwerp 01

GACEP 181
 Andy Van Der Steen
[Signature]

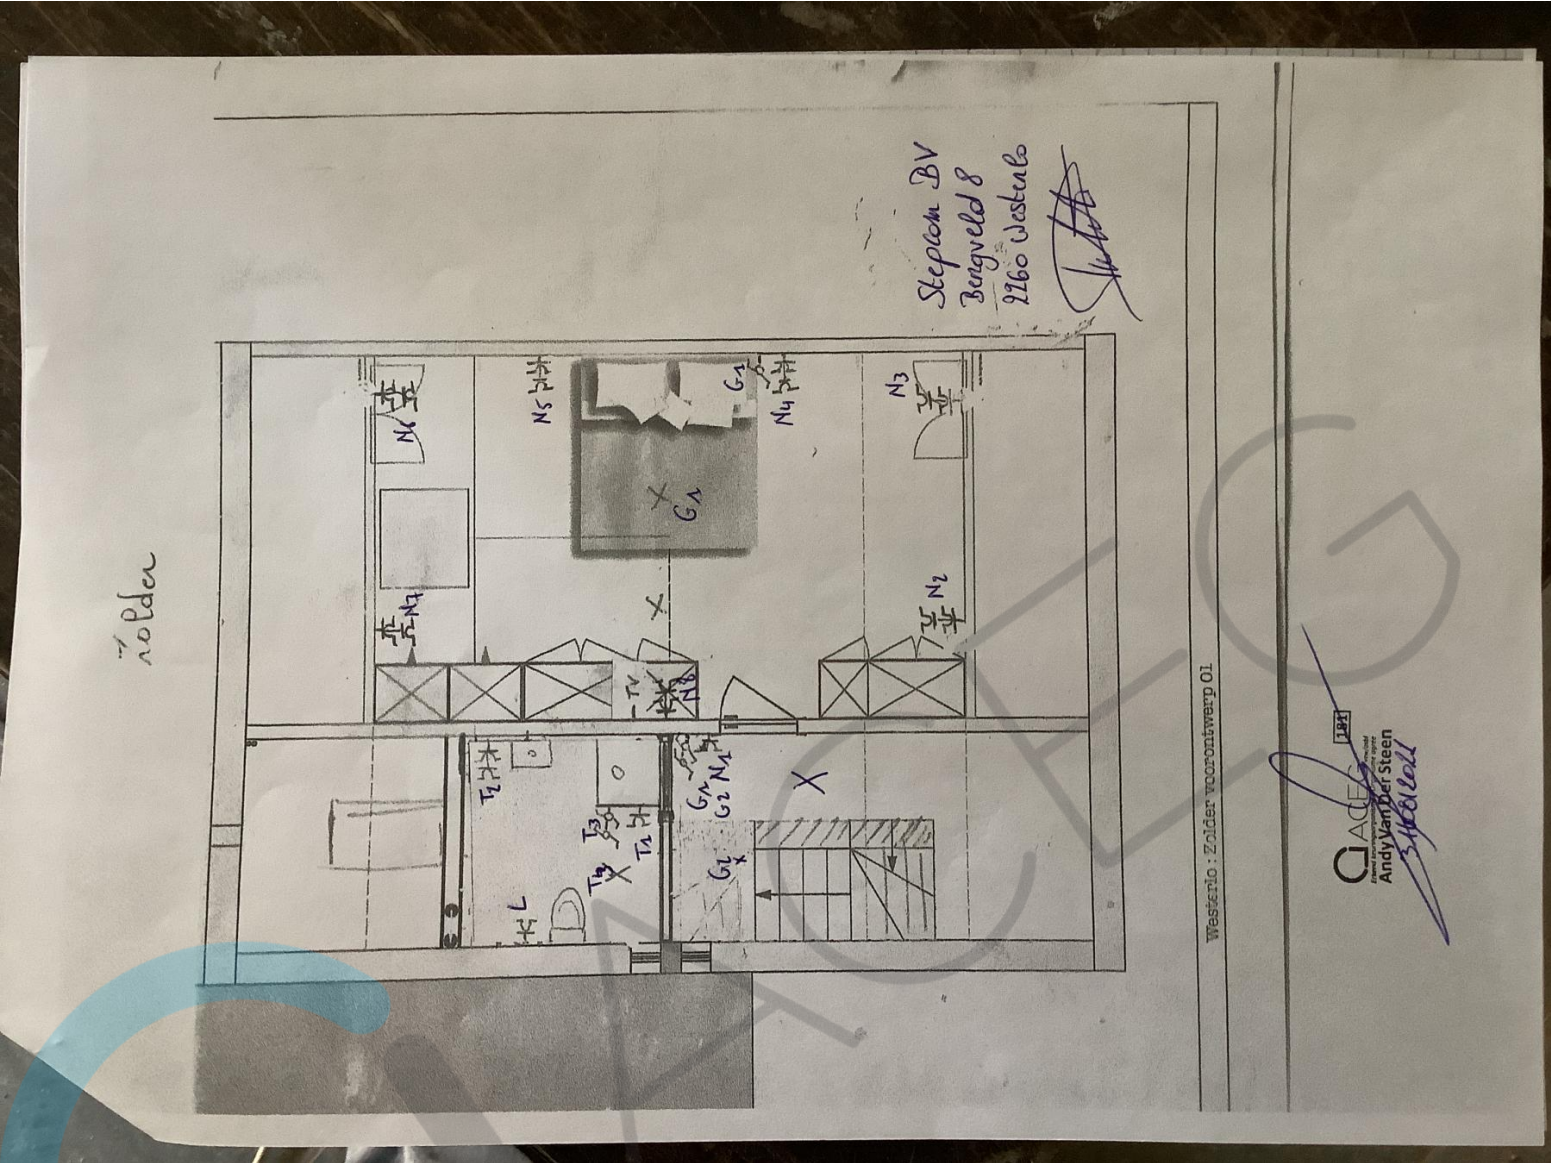

nolder

Stepien BV
Bergveld 8
2160 Westerbeek

Westerio : Zolder voorontwerp 01

GACE
Andy Van Der Steen
S. H. H. H. H.



